

Processen vid framtagande av dagvattenplan och -policy – erfarenheter

Camilla Ranlund



1

Vem är jag?

- VA-ingenjör, Upplands-Bro kommun (tjänstledig)
- Åtgärdssamordnare för Svartån, Västerås stad

Upplands-Bro:

- Snabbväxande kommun med ca 30 000 invånare



2

Innehåll

- Bakgrund
- Hur har vi gått tillväga?
- Utmaningar
- Återkoppling från projektgruppen
- Medskick



Bakgrund

- VA-plan 2018, följduppdrag från kommunfullmäktige
- Förutsättningar:
 - Ingen tidigare dagvattenplan
 - Avslag från Länsstyrelsen för detaljplan
 - VA projektägare



Hur har vi gått tillväga?



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

5

1. Förstudie


- Omvärldsbevakning
- Mindre förstudiegrupp
 - Vad vill vi ha?
 - Vad behöver vi?
 - Vilka avgränsningar behövs?
 - Vilket externt stöd behöver vi för genomförandet?



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

6

2. Skapa projektgrupp

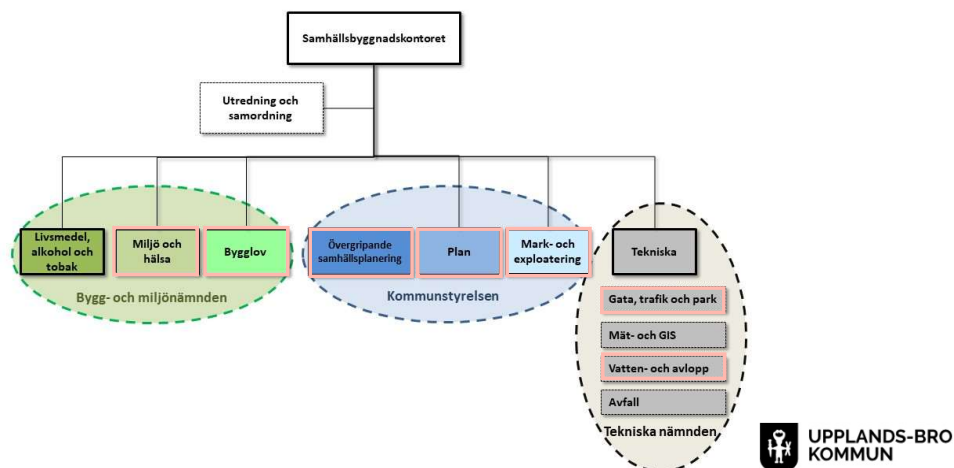

7

2. Upphandling av konsultstöd

- Våra behov:
 - Kunskap om processen och om strategiska dokument: dagvattenplaner, -policys
 - Expertkunskap dagvatten
 - Skrivstöd vid behov och textgranskning



8

3. Genomförandet

- Mindre grupper inom vissa moment
 - Granskning av projektgruppen
- Kontinuerlig behovslista
- Infobrev
- Förankring med politiken
- Remiss till alla berörda



Vad?

- Policyn
 - Övergripande mål
- Planen
 - Samlar och tydliggör kommunens arbete
 - Lagar och ansvarsförhållanden
 - Nuläge och framtida behov



Ansvarsfördelningen

- Identifiera oklarheter
- Avgränsningsproblem mellan avdelningar
 - Möte de avdelningarna inkl. chef + konsult + jurist
 - Möte endast de avdelningarna inkl. chef
- Andra intressenter: UBH/UBKF, räddningstjänsten



4. Politiskt beslut

- Här vi är just nu



Hur lång tid tog det?

- Förstudie 6 månader
- Forma projektgrupp och upphandling 8 månader
- Genomförande 1 år 1 månad
- Remiss, remissvar, bearbetning 5 månader
- Politiska processen 6 månader?

Totalt: 3 år 2 månader



Utmaningar

- Olika perspektiv
- Olika kunskapsnivåer
- Ansvarsfördelningen
- Tid
- Juridiken
- Digitalt (Pandemin)



Återkoppling från projektgruppen

- Tydligare förankring med cheferna om behov av tid
- Tidigare möten med berörda avdelningar
- Bra med inspirationsföreläsning och studiebesök i fält
- Bra med juridisk expertis och externt stöd för ansvarsfördelningen
- Lärorikt



15

Medskick

- Inspireras av andra
- Processen viktig, höjer kunskapen
- Bättre att få till något än att få med allt
- Extern hjälp kan underlätta där det finns konflikter



16

Tack!

Kontaktuppgifter:

Camilla Ranlund

camilla.ranlund@vasteras.se

021-397787

<https://www.upplands-bro.se/dagvattenplan>



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

